ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„Благоустроителни дейности в Мемориален комплекс „Ботев път" – Общини Козлодуй, Мизия, Борован и Враца"

ДО: Областен Управител на Област Враца
гр.Враца 3000, бул. „ Демокрация „ № 1
(наименование и адрес на възложителя)

От: „ ПЪТРЕМОНТ „ ООД
(наименование на участника)

със седалище и адрес: гр. Враца, ул. „ Стоян Кялъчев „, № 25,ет.1, ап.1
тел.: 092/624497, факс: 092/624497, e-mail: patremont@abv.bg, ЕИК: 106 544 209,
представлявано и управлявано от Красимира Тодорова Кунова - Василева, на длъжност Управител
Дата и място на регистрация по ДДС: 19.12.2002г. гр.Враца

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето **Техническо предложение** за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Благоустроителни дейности в Мемориален комплекс „Ботев път" – Общини Козлодуй, Мизия, Борован и Враца"

Техническото предложение е изготвено въз основа на изисквания към предмета на поръчката, описани в документацията за участие. Запознати сме с всички условия и изисквания в поръчката и приложенията към нея, като с настоящото правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка:

Приемаме, да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на валидност на нашата оферта.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение.

Ние предлагаме да организираме и изпълним поръчката, в посочената документация, техническите спецификации и изисквания, при следните условия: /описва се подробно предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя/.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Подробно предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Дата	27/ 04/2017г.
Име и фамилия	Красимира Василева
Подпис на лицето (и печат)	....

Подписите заличени на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

ТЕХНИЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

След като се запознахме с документацията за участие, с настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на услуга с предмет:

" Благоустроителни дейности в Мемориален комплекс "Ботев път" - Общини Козлодуй, Мизия, Борован и Враца" при следните условия:

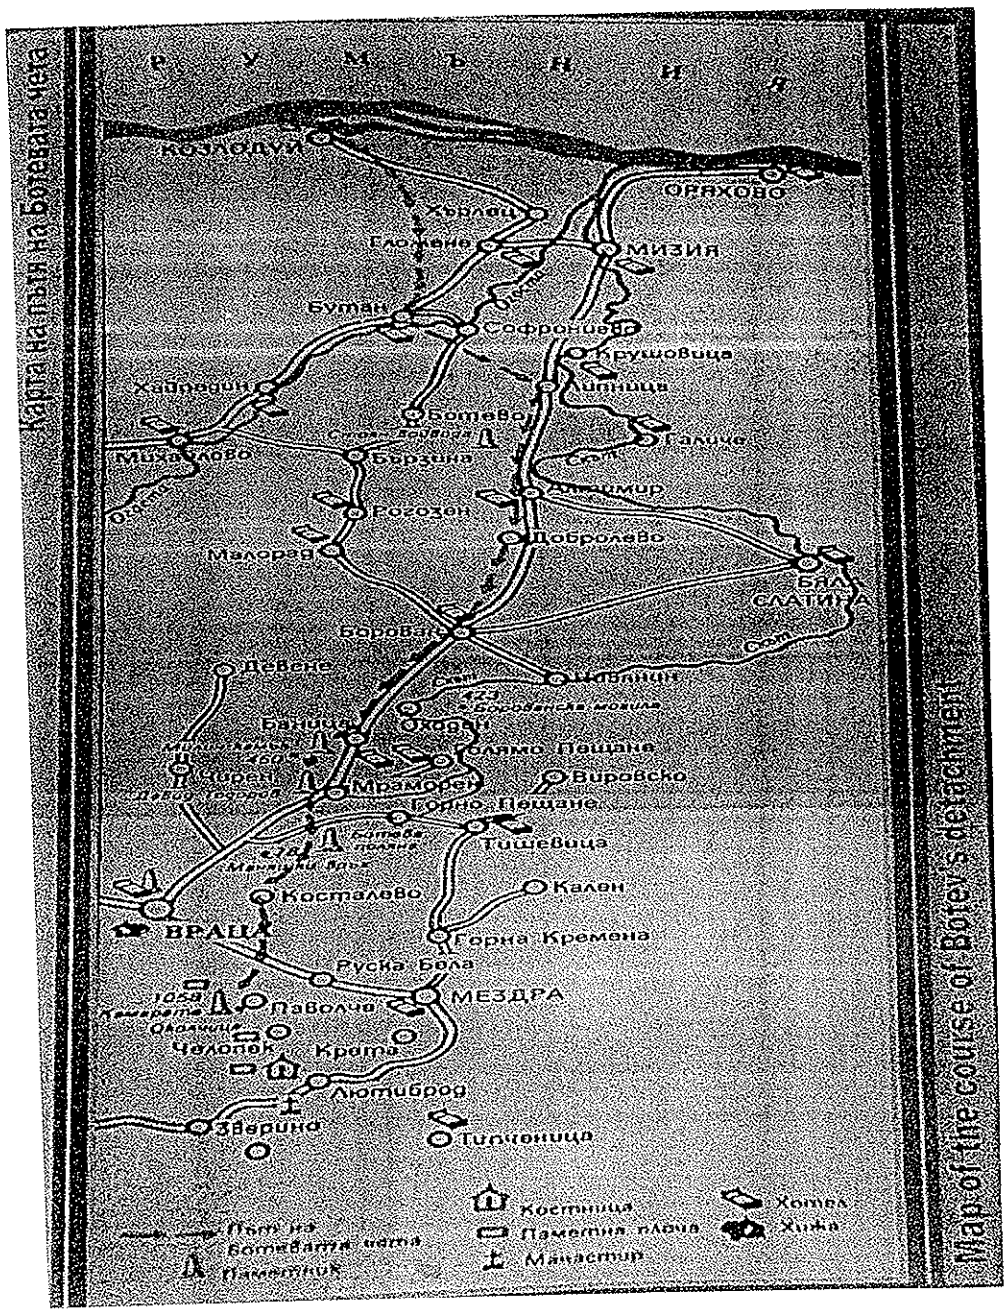

Предлагаме да организираме и изпълним услугата, съгласно изискванията на Възложителя:

- *При изпълнение предмета на услугата ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, Техническите спецификации и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на услугата;*
- *Всички дейности ще се изпълняват, съгласно описанието в Техническата спецификация със собствена техника и оборудване:*

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено услугата в пълно съответствие с горепосоченото предложение, изискванията на Възложителя и Манипулационен график за изпълнение.

Декларираме, че сме запознати с указанията, условията за участие и документацията в обявената от Вас публична покана. Съгласни сме с поставените изисквания и ги приемаме без възражения.

ПЛАН ЗА РАБОТА

При започване на обекта изпълнителя задължително прави инструктаж на работното място на целия персонал.Използват се лични предпазни средства, проверено и изправно оборудване, механизация и транспортни средства .

За осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове са предвидени следните мерки:

- *Задължително провеждане на ежедневен инструктаж на следните теми: Товаро-разтоварни работи, Безопасна работа с ел. оборудване, с тежести, експлоатация на автомобилите и механизацията .*

1. Обектът предмет на настоящата услуга съдържа следните дейности:

** Косене на тревни площи*

**Събиране на окосена трева*

**Изсичане на гъсти храсти с храсторез*

**Резитба на единични клони*

**Резитба на единични храсти и издънки на дървета*

**Отсичане на дървета с диаметър до 10 см .*

**Изкореняване на дървета с диаметър от 11 до 20 см.*

**Разтрупване на паднали дървета с изнасяне на площадка за товарене*

**Изнасяне на отсечени дървета, храсти и клони на разстояние повече от 50 м.*

**Товарене и извозване с камион на растителни отпадъци до сметище /клони, трева и др./*

**Товарене и извозване с камион на дървен отпадък и трупи от отсечени дървета*

*Товарене и извозване на строителни отпадъци до сметище

*Товарене и извозване на битови отпадъци до РДТБО

*Възстановяване на указателни табели и знаци

*Направа дървено мостче на р. Скът

*Ремонт на стълби при моста на с. Косталево

*Ремонт на трибуна със съществуващи плочи на връх Околчица

За изпълнението разполагаме с квалифициран персонал:

- *Пътен инженер – Ръководител обект*
- *Технически ръководители – двама*
- *Координатор по безопасност и здраве при работа*
- *Ръководител механизация и автотранспорт*
- *Пътни работници – дванадесет човека*
- *Шофьори и машинисти – пет човека*

необходимата техника и оборудване за Благоустроителните дейности, товарни автомобили за превоз на инструменти и техническо оборудване, отпадъци, транспортни автомобили за превоз на работници.

2. ***Организацията на работа позволява едновременно извършване на няколко технологични потока:***

I. Рязане храсти, клони и издънки на дървета, изкореняване, разтрупване и изнасяне на дървета , товарене и извозване;

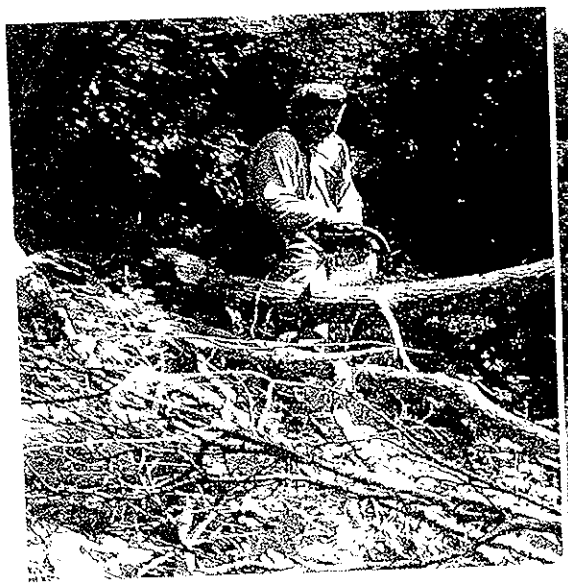

Ще се извършва по Манипулационния график, след възлагане от служител на Областна администрация - Враца, упълномощен със заповед на Областния управител на област Враца.

Цялото количество клони от резитба за деня задължително в срок до 2 [illegible] се извозва до определено от Възложителя място.

Няма да се допуска изоставяне на клони или растителни отпадъци върху тревните площи, или до и в контейнерите за битови отпадъци.

С резитбата ще се регулират формата и големината на дървесно- храстовите видове, с цел осигуряване на проходимост. Изкореняването и отсичането на дървета и храсти, се прилага при изпочупени, загнили или вече изсъхнали видове.

За безопасна работа, работниците заети с кастренето и тези които събират клоните да са на разстояние не по-малко от 2-4м.

Техника и оборудване:

- *Храсторези- 6 бр.*
- *Резачка за дърва - 4 бр.*
- *Ел.агрегат - 2 бр.*
- *Товарни автомобили- 2 бр.*
- *Багер товарач – 1бр.*

Брой персонал:

- *Технически ръководител- 1 бр.*
- *Квалифицирани работници- 6 броя;*

II. Косене на тревни площи,, събиране, товарене и извозване на растителни, битови и строителни отпадъци ;

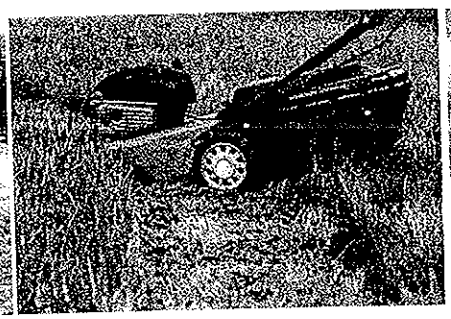
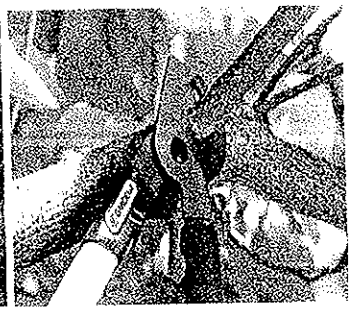

Дейността включва косене, събиране и извозване на окосената трева. Чрез косенето се регулира височината на тревостоя. Тревата в зелените площи ще се реже не по-ниско от 5-6 см височина, равномерно за цялата площ.

Цялото количество окосена трева за деня задължително се събира и в срок до края на същия ден се извозва до определено от Възложителя място. Няма да допуснем изоставяне на окосената трева върху тревните площи или до и в контейнерите за битови отпадъци.

Техника и оборудване: пригодени за косене на груби треви и храсти на стръмни, наклонени терени и крайпътни откоси.

- *Товарни автомобили- 2 бр.*
- *Багер товарач – 1бр.*
- *Моторна коса -3 бр.*
- *Самоходна косачка – 3 бр.*
- *Ръчна коса- 2 бр.*
- *Ръчни гребла- 3 бр.*
- *Вили ръчни- 4бр.*

Брой персонал:

- *Технически ръководител- 1 бр.*
- *Квалифицирани работници- 5 броя;*

III. Възстановяване на указателни табели и знаци, направа дървено мостче ;

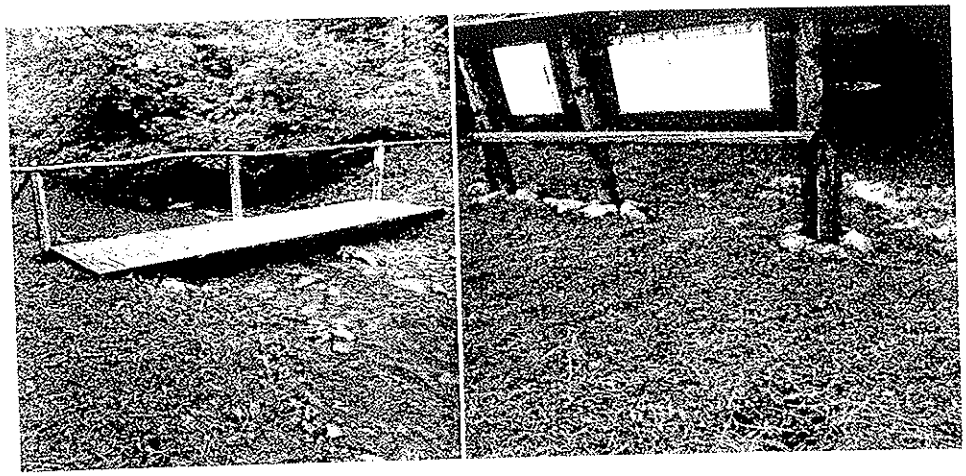

Указателните табели ще бъдат изработени от дърво и надписани двустранно.Ще се поставят на мястото на повредените или липсващите.
Дървено мостче- направено от иглолистни греди и дъски, обезопасено с парапет.

Техника и оборудване:

- *Товарен автомобил- 1 бр.*

Брой персонал:

- *Технически ръководител- 1 бр.*
- *Квалифицирани работници- 2 броя;*

IV. Ремонт на стълби при моста на с. Косталево, ремонт на трибуна със съществуващи плочи на връх Околчица;

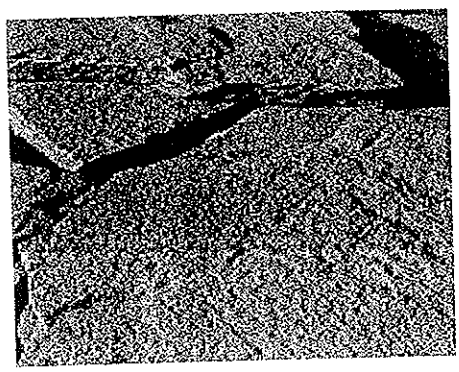

Плочите ще се залепват с цименто-пясъчен разтвор, приготвен в съотношение 1:3.Поради факта, че настилката ще се прави върху вече остарели бетонови повърхности, при които свързването между пресния циментов разтвор и стария бетон не е достатъчно здраво. Затова първото което ще направим, е повърхността да се измие възможно най-добре, за да се почисти и напълно обезпраши, а естествените пори на повърхността да се отворят. Основата ще се обработи със специални препарати, чието предназначение е да послужат като ефективна връзка между новия пласт и основата. Освен по-здравото свързване между двата пласта по този начин се подобрява и еластичността на връзката помежду им. Това намалява опасността от напукване и отлепване на настилката след време в резултат на термични разширения.

Плочите се полагат върху предварително разстлан циментo-пясъчен разтвор. Тънкостта тук е в гъстотата на разтвора. Когато е прекалено рядък, камъните лесно потъват в него, по-трудно се подравняват, а разтворът лесно избива през фугите и зацапва повърхността на плочите. При прекалено гъст разтвор плочите по-трудно се наместват на желаната дълбочина и може да не залепнат достатъчно здраво. Плочите се причукват с чук, докато потънат до необходимото ниво, а то се контролира чрез дълъг алуминиев мастар. Нивото на настилката се определя предварително по най-високите точки на основата, като временно се залепват реперни плочки, по които се определя нивото на останалите. Разполагането на отделните плочи се съобразява с формата и големината им с оглед помежду им да не остават прекомерно широки фуги. За краищата на настилката се подбират плочи с равни кантове. Те може да се оформят чрез очукване (при пясъчниците) или чрез рязане.

Техника и оборудване:

- *Товарен автомобил- 2 бр.*
- *Ел.агрегат - 2 бр.*

Брой персонал:

- *Технически ръководител- 1 бр.*
- *Квалифицирани работници- 3 броя;*

3. *Текущ контрол от Изпълнителя:*

Текущия контрол по изпълнение на услугата се извършва от Главният инженер и Координатор по качеството и Техническите ръководители,съгласно изискванията на въведените системите за управление:
ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007,EN ISO 14001:2015
Благоустроителните дейности ще бъдат изпълнени качествено и в срок, съгласно утвърдения от Възложителя Манипулационен график.
Ще се вземат мерки за опазване на околната среда, всички отпадъци ще бъдат своевременно натоварени и извозени на определените за тази цел места. Ще изработим схема за организация и безопасност на движението по време на работа съгласно Наредба № 16 от 2001 г., както и изискванията на Наредби № 1, 2 и 18 от 2001 г. Координаторът по безопасност и здраве отговаря за спазване на Наредба №2 по ЗБУТ.

4. *Предаване на извършените дейности:*
Изпълнените Благоустроителните дейности се удостоверяват с изготвяне и подписване на двустранен Приемо-предавателен протокол.

Дата *27/ 04/2017г.*
Име и фамилия *Красимира Василева*
Подпис на лицето (и печат) .....

Подпишете заличени на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за валидност на офертата

Подписаният: Красимира Тодорова Кунова- Василева
(трите имена)

Данни по документ за самоличност: ЛК № д. на . от МВР-Вр.

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител
(длъжност)

на Участник: „ Пътремонт „ ООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустроителни дейности в Мемориален комплекс „Ботев път" – Общини Козлодуй, Мизия, Борован и Враца"

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :

Срокът на валидност на нашата оферта е 95/деветдесет и пет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите в настоящата обществена поръчка.

Дата	27/ 04/ 2017г.
Име и фамилия	Красимира Василева
Подпис на лицето (и печат)	.....

Заличени на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие с клаузите на договора

Подписаният: Красимира Тодорова Кунова- Василева
(трите имена)

Данни по документ за самоличност: ЛК . 9 изд. на . г. от МВР .
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител
(длъжност)

на Участник: „ Пътремонт „ ООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустроителни дейности в Мемориален комплекс „Ботев път" – Общини Козлодуй, Мизия, Борован и Враца"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и съм съгласен с клаузите му.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата	27/ 04/ 2017г.
Име и фамилия	Красимира Василева
Подпис на лицето (и печат)	.....

Заличени на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Услуга с предмет „Благоустроителни дейности в Мемориален комплекс „Ботев път" – Общини Козлодуй, Мизия, Бороване и Враца"

1.Териториален обхват и описание на услугата:

№	Видове работи	Единична мярка	Количество
1	Косене на тревни площи	дка	260
2	Събиране на окосена трева	дка	260
3	Изсичане на гъсти храсти с храсторез	$м^2$	7800
4	Резитба на единични клони	бр.	2500
5	Резитба на единични храсти и издънки на дървета	бр.	15000
6	Отсичане на дървета с диаметър до 10 см - всички операции	бр.	80
7	Изкореняване на дървета с диаметър от 11 до 20 см - всички операции	бр.	20
8	Разтрупване на паднали дървета с изнасяне на площадка за товарене	бр.	30
9	Изнасяне на отсечени дървета, храсти и клони на разстояние повече от 50 м	$м^3$	50
10	Товарене и извозване с камион на растителни отпадъци до сметище		

	/клони, трева и др./	$м^3$	140
11.	Товарене и извозване с камион на дървен отпадък и трупи от отсечени дървета	$м^3$	60
12	Товарене и извозване на строителни отпадъци до сметище	$м^3$	10
13	Товарене и извозване на битови отпадъци до РДТБО	$м^3$	10
14	Възстановяване на указателни табели и знаци	бр.	60
15	Направа дървено мостче на р. Скът	бр.	1
16	Ремонт на стълби при моста на с. Косталево	бр.	1
17	Ремонт на трибуна със съществуващи плочи на връх Околчица	бр.	1

Груповият исторически паметник на културата от национално значение Мемориален комплекс „Ботев път", включва трасето на похода на Ботевата чета от Козлодуйския бряг до Врачански балкан с площ от около 1820 декара, заедно с разположените по него исторически паметници на културата: Козлодуйски бряг, Матеев геран, Попово ханче, Милин камък, Лобното място на Давид Тодоров, Ботева поляна „Веслец", връх „Околчица", падината „Йолковица" – Лобното място на Христо Ботев.

Алеята с ширина 3 м преминава през горски територии, пасища, земеделски земи и участъци от трасетата на републиканската и общинската пътна мрежа на територията на Общини Козлодуй, Мизия, Бороване и Враца.

Дейностите по почистване и поддържане на зелени площи включват: косене на тревните площи, събиране и извозване на окосената трева, резитба на храсти и издънки, отсичане на дървета, изкореняване на дънери и извозване.

Дейностите по тази услуга се възлагат, контролират, приемат и отчитат от служител на Областна администрация - Враца, упълномощен със заповед на Областния управител на Област Враца.

2. Изисквания за изпълнение на дейностите:

Всички дейности ще се изпълняват съгласно описанието в настоящите Технически спецификации и Манипулационен график.

2.1. Косене на тревни площи и събиране на окосената трева:

Дейността включва косене, събиране и извозване на окосената трева. Чрез косенето се регулира височината на тревостоя. Тревата в зелените площи трябва да се реже не по-ниско от 5-6 см височина, което да бъде равномерно за цялата територия. Събирането на окосената трева е задължително, за да не се получава непропусклив слой, който да задушава тревния чим.

Обемът на манипулацията е съгласно описаните площи. Изисква се фирмите да са оборудвани с техника за косене – моторни косачки за косене на свободни площи, които да отговарят на нормативните изисквания.

Цялото количество окосена трева за деня задължително се събира и в срок до края на същия ден се извозва до определено от Възложителя място. За предадената биомаса, Изпълнителят трябва да представи при актуването на извършените работи, издадените от депото бележки с конкретното количество на извозената маса.

Не се допуска изоставяне на окосената трева върху тревните площи или до и в контейнерите за битови отпадъци.

2.2. Резитба на храсти и издънки:

Извършва се по Манипулационния график, след възлагане от служител на Областна администрация - Враца, упълномощен със заповед на Областния управител на област Враца.

Изисква се фирмите да са оборудвани с техника и инструменти за рязане на храсти, клони, издънки и дървета.

Цялото количество клони от резитба за деня задължително в срок до 2 дни се извозва до определено от Възложителя място. За предаденото количество растителни отпадъци, Изпълнителят трябва да представи при актуването на извършените работи, издадените от депото, бележки с конкретното количество на извозената маса.

Не се допуска изоставяне на клони или растителни отпадъци върху тревните площи, или до и в контейнерите за битови отпадъци.

2.3. Резитба и премахване на дървесна растителност:

Извършва се по преценка и възлагане от служител на Областна администрация - Враца, упълномощен със заповед на Областния управител на област Враца.

Изисква се фирмите да са оборудвани с техника и механизация за резитба и отсичане, които да отговарят на нормативните изисквания.

В следствие от аварийни ситуации и бедствия, опасните и паднали дървета се отстраняват незабавно от засегнатите площи.

Цялото количество растителен отпадък - клони от резитба или отсичания за деня задължително в срок до 2 дни се извозва до определено от Възложителя място. За предадената биомаса, Изпълнителят трябва да представи при актуването на извършените работи, издаваните от депото, бележки с конкретното количество на извозени с камион дървен отпадък и трупи от отсечени дървета. Получеият от отсичане на дървесна растителност дървен материал, се маркира с районната марка за маркиране на дървен материал, добит извън Горски фонд. За извозването на

дървесината се издава превозен билет от упълномощения общински специалист и материалът се извозва на места, посочени от Възложителя.

Не се допуска изоставяне на растителни отпадъци и дървесина върху тревните площи или до и в контейнерите за битови отпадъци.

2.4. Поддържане на чистота, оборки и почистване на нерегламентирани сметища в зелени площи:

Извършва се по възлагане от служител на Областна администрация - Враца, упълномощен със заповед на Областния управител на област Враца.

Обемът на оборките е съгласно описаните площи. Извършва се ръчно. Кратността на оборките и събирането на отпадъци е съгласно Манипулационен график. Събраните отпадъци се изнасят своевременно в контейнерите за битови отпадъци.

Обемът на събирането на отпадъците от нерегламентирани сметища в зелени площи се извършва по преценка на Възложителя. Събраните отпадъци от нерегламентирани сметища със строителен характер се извозват до депото в гр. Враца, а тези от битов характер се изнасят своевременно в контейнерите за битови отпадъци.

2.5. Извозване на отпадъците:

В частта „Извозване на отпадъците" е необходимо да се спазват следните изисквания:

• отпадъци с битов характер и опаковки, получени от оборки, почистване на сметище в зелена площ се изнасят своевременно и се оставят в контейнерите за битови отпадъци;

• зелени отпадъци – окосена трева, шума, клони и др. подобни се извозват до определено от Възложителя място. За предадената биомаса се представят бележките от определено от Възложителя място, по които ще се извършва плащането на извозените количествата.

• дървен материал/дървесина, получени от аварийно или рутинно отсичане на дървесна растителност, се извозват до място, посочено от Възложителя.

3. Начин на определяне на вида и количеството работа:

Количеството и вида на работа се определя с Техническите спецификации и Манипулационния график.

3.1. Косене, събиране и извозване на окосената трева:

Косенето, събирането и извозването на окосената трева се определя в Манипулационния график.

3.2. Резитбата на храсти:

Резитбата на храсти се определя чрез Манипулационния график, като се уточняват количествата и местоположенията на отделните храстови групи и масиви.

3.3. Всички останали дейности:

Дейностите по тази услуга - видове работа, тяхното количество и обем се възлагат чрез Манипулационния график.

4. Оценка на извършената работа по приоритетни манипулации:

4.1. Косене, събиране и извозване на окосената трева:

Косенето, събирането и извозването на окосената трева се извършва на 100% от обема, от възложената работа в Манипулационния график.

При неизпълнение на дейността към датата на крайния срок в пълния обем по възлагане, неизпълнението се документира, като се описва в протокол обемът на неизпълнената работа. За обективни причини и обстоятелства, довели до неизпълнение на манипулациите в посочените срокове се считат лоши метеорологични условия, доказани с протокол от Метеорологичната служба, ограничителни мерки на органите на сигурността и реда или др. подобни, чийто характер е доказуем от Изпълнителя.

4.2. Резитби:

За извършени се приемат всички възложени резитби, които са изпълнени, растителните отпадъци извозени, за което са съставени съответните протоколи.

5. Проверка на извършената работа по приоритетни манипулации:

Изпълнителят докладва ежедневно на Възложителя за извършената от него работа. Дейностите се приемат от Възложителя чрез специално назначена за целта Комисия. За приемането на манипулациите от комисията се съставят ежедневни констативни протоколи и Обобщен окончателен констативен протокол. Актуването на извършените работи се приема чрез Протокол за извършената работа – образец 19.

5.1. Всички останали видове манипулации:

Извършената работа се отчита и приема от Възложителя с вписване в Констативен протокол за извършена работа и подписването на Протокол – образец 19.

Неразделна част от настоящите технически спецификации е Манипулационния график.

МАНИПУЛАЦИОНЕН ГРАФИК

Обект: "Благоустроителни дейности в Мемориален комплекс"Ботев път" - Общини Бороване, Враца, Козлодуй и Мизия през М. МАЙ 2017 ГОДИНА

№	ОБЕКТИ / ДЕЙНОСТИ	Бивак на Козлодуйски бряг и трасе от алеята - Козлодуйски бряг - Матеев геран - околовръстен път	Трасе от алеята Ботев път - Околовръстен път Козлодуй - с. Бутан	Бивак на територията на с. Софроние во и трасе от алеята с. Софроние во - с. Липница	Трасе от алеята Ботев път - с. Алтимир - с. Доброле во	Бивак на територията на с. Бороване и трасе от алеята Ботев път - с.Доброл ево - с. Бороване	Бивак на територията на с. Баница и трасе от алеята Ботев път - с. Баница - Милин камък	Трасе от алеята Ботев път- Милин камък - лобното място на Давид Тодоров	Трасе от алеята Ботев път - лобното място на Давид Тодоров - Речка	Бивак на Речка и трасе от алеята Ботев път - Речка - с. Косталево	Трасе от алеята Ботев път - с. Косталево - гр. Враца	Бивак на Ботева поляна и трасето от алеята Ботев път - гр. Враца - връх Околчица
1	Косене на тревни площи	16.5.2017	17.5.2017	18.5.2017	19.5.2017	20.5.2017	21.5.2017	23.5.2017	24.5.2017	25.5.2017	26.5.2017	27.5.2017
2	Събиране на окосена трева	16.5.2017	17.5.2017	18.5.2017	19.5.2017	20.5.2017	21.5.2017	23.5.2017	24.5.2017	25.5.2017	26.5.2017	27.5.2017
3	Изсичане на гъсти храсти с храсторез	16.5.2017	17.5.2017	18.5.2017	19.5.2017	20.5.2017	21.5.2017	23.5.2017	24.5.2017	25.5.2017	26.5.2017	27.5.2017
4	Резитба на единични клони	16.5.2017	17.5.2017	18.5.2017	19.5.2017	20.5.2017	21.5.2017	23.5.2017	24.5.2017	25.5.2017	26.5.2017	27.5.2017
5	Резитба на единични храсти и издънки на дървета	16.5.2017	17.5.2017	18.5.2017	19.5.2017	20.5.2017	21.5.2017	23.5.2017	24.5.2017	25.5.2017	26.5.2017	27.5.2017
6	Отсичане на дървета с диаметър до 10 см - всички операции	16.5.2017	17.5.2017	18.5.2017	19.5.2017	20.5.2017	21.5.2017	23.5.2017	24.5.2017	25.5.2017	26.5.2017	27.5.2017
7	Ремонт на стълби при моста на с. Косталево											27.5.2017
8	Ремонт на трибуна със съществуващи плочи на връх Околчица											27.5.2017
9	Изкореняване на дървета с диаметър от 11 до 20 см - всички операции	16.5.2017	17.5.2017	18.5.2017	19.5.2017	20.5.2017	21.5.2017	23.5.2017	24.5.2017	25.5.2017	26.5.2017	27.5.2017
10	Разтрупване на паднали дървета с изнасяне на площадка за товарене	16.5.2017	17.5.2017	18.5.2017	19.5.2017	20.5.2017	21.5.2017	23.5.2017	24.5.2017	25.5.2017	26.5.2017	27.5.2017
11	Изнасяне на отсечени дървета, храсти и клони на разстояние повече от 50 м	16.5.2017	17.5.2017	18.5.2017	19.5.2017	20.5.2017	21.5.2017	23.5.2017	24.5.2017	25.5.2017	26.5.2017	27.5.2017
12	Товарене и извозване с камион на растителни отпадъци до РДТБО/ клони, шума, трева и др./	16.5.2017	17.5.2017	18.5.2017	19.5.2017	20.5.2017	21.5.2017	23.5.2017	24.5.2017	25.5.2017	26.5.2017	27.5.2017
13	Товарене и извозване с камион на дървен отпадък и трупи от отсечени дървета	16.5.2017	17.5.2017	18.5.2017	19.5.2017	20.5.2017	21.5.2017	23.5.2017	24.5.2017	25.5.2017	26.5.2017	27.5.2017

14	Товарене и извозване на строителни отпадъци до сметище	16.5.2017	17.5.2017	18.5.2017	19.5.2017	20.5.2017	21.5.2017	23.5.2017	24.5.2017	25.5.2017	26.5.2017	27.5.2017
15	Товарене и извозване на битови отпадъци до РДТБО	16.5.2017	17.5.2017	18.5.2017	19.5.2017	20.5.2017	21.5.2017	23.5.2017	24.5.2017	25.5.2017	26.5.2017	27.5.2017
16	Възстановяване на указателни табели и знаци	16.5.2017	17.5.2017	18.5.2017	19.5.2017	20.5.2017	21.5.2017	23.5.2017	24.5.2017	25.5.2017	26.5.2017	27.5.2017
17	Направа дървено мостче на р. Скът											27.5.2017

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Благоустроителни дейности в Мемориален комплекс „Ботев път" – Общини Козлодуй, Мизия, Борован и Враца"

ДО: Областен Управител на Област Враца
гр.Враца 3000, бул. „ Демокрация „ № 1
(наименование и адрес на възложителя)

От: „ ПЪТРЕМОНТ „ ООД
(наименование на участника)

със седалище и адрес: гр. Враца,ул. „ Стоян Кялъчев „„ № 25, ет.1, ап.1
тел.: 092/624497, факс: 092/624497, e-mail: patremont@abv.bg, ЕИК: 106 544 209,
представлявано и управлявано от Красимира Тодорова Кунова - Василева, на длъжност Управител
Дата и място на регистрация по ДДС: . . ица
Разплащателна сметка:
банков код: ;
банкова сметка: ;
банка:
град/клон/офис: Враца;

Начислен на осн. чл. 82(2) от ЗКИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустроителни дейности в Мемориален комплекс „Ботев път" – Общини Козлодуй, Мизия, Борован и Враца" , както следва:

Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката е: **48 827.70лв.,** (словом: четиридесет и осем хиляди осемстотин двадесет и седем лева и седемдесет стотинки) **без ДДС** или **58 593.24 лв.** (словом : петдесет и осем хиляди петстотин деветдесет и три лева и двадесет и четири стотинки) **с начислен ДДС.**

Гарантираме, че при така предложените от нас условия, в нашата цена на договора за изпълнение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение и включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката.

Съгласни сме плащането на Цената за изпълнение на договора да се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на **3% (три процента)** от стойността му, без ДДС.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 95 (деветдесет и пет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Списък по образец на дейностите, предмет на поръчката, с посочени отделни цени за всяка дейност

Дата	27/ 04/2017г.
Име и фамилия	Красимира Василева
Подпис на лицето (и печат)	.....

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Списък по образец на дейностите, предмет на поръчката, с посочени отделни цени за всяка дейност

№	Видове работи	Единична мярка	Количество	Цена
1	Косене на тревни площи	дка	260	51,50
2	Събиране на окосена трева	дка	260	19,30
3	Изсичане на гъсти храсти с храсторез	$м^2$	7800	1,75
4	Резитба на единични клони	бр.	2500	1,55
5	Резитба на единични храсти и издънки на дървета	бр.	15000	0,42
6	Отсичане на дървета с диаметър до 10 см - всички операции	бр.	80	1,70
7	Изкореняване на дървета с диаметър от 11 до 20 см - всички операции	бр.	20	11,60
8	Разтрупване на паднали дървета с изнасяне на площадка за товарене	бр.	30	10,76
9	Изнасяне на отсечени дървета, храсти и клони на разстояние повече от 50 м	$м^3$	50	16,60
10	Товарене и извозване с камион на растителни отпадъци до сметище /клони, трева и др./	$м^3$	140	9,55
11.	Товарене и извозване с камион на дървен отпадък и трупи от отсечени дървета	$м^3$	60	12,10

12	Товарене и извозване на строителни отпадъци до сметище	$м^3$	10	21,56
13	Товарене и извозване на битови отпадъци до РДТБО	$м^3$	10	20,15
14	Възстановяване на указателни табели и знаци	бр.	60	10,76
15	Направа дървено мостче на р. Скът	бр.	1	469,60
16	Ремонт на стълби при моста на с. Косталево	бр.	1	1275,15
17	Ремонт на трибуна със съществуващи плочи на връх Околчица	бр.	1	203,45

Заличени на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Платете на - име на получателя
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА

IBAN на получателя
BG [illegible]

Вид плащане

BIC на банката на получателя
UBBS8002

При банка - име на банката на получателя

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ (ВНОСНА БЕЛЕЖКА) ЗА ПЛАЩАНЕ КЪМ БЮДЖЕТА

Вид валута: BGN

Сума: 1464.83

Основание за плащане/внасяне - вид данък, такса, осигуровка, мито, лихва...
Г-Я ЗА ИЗП. 3% ОБЩЕСТВ. ПОРЪКА

Още пояснения
БЛАГОУСТР. Д-СТИ В МК "БОТЕВ ПЪТ"

Вид: 9

номер на документа, по който се плаща

Дата на документа

Период, за който се отнася плащането
От дата: До дата:

Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице
PATREMONT OOD OOD

БУЛСТАТ на задълженото лице
106544209

ЕГН/ЛНЧ на задълженото лице

Номер от НДР на задълженото лице

Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице
PATREMONT OOD OOD

IBAN на наредителя

BIC на банката на наредителя

При банка - име на банката на поръчителя

РИНГС: Не

РИНГС Дата

Дата на плащане: 09.05.2017

Вальор: 09.05.2017

Бордеро: B170509860198068OPBISERA

Заличен на осн. чл. 62(2) от ЗЗЛД

Заличен на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
